

|                                                                                   |                                                     |                                                                            |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                     | <b>FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO<br/>- CCTV<br/>Proyecto Tasa de Seguridad</b> | <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia |
| ID punto de cámara                                                                | 61-PC8                                              |                                                                            |                                                                                                                                          |
| Municipio                                                                         | La Pintada                                          |                                                                            |                                                                                                                                          |
| Departamento                                                                      | Antioquia                                           |                                                                            |                                                                                                                                          |
| Fecha diagnóstico                                                                 | 14/01/2026                                          |                                                                            |                                                                                                                                          |
| Operador                                                                          | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A. -CI2 S.A |                                                                            |                                                                                                                                          |
| Técnico responsable                                                               | Lisbeth Cardona                                     |                                                                            |                                                                                                                                          |
| Contrato disponible                                                               | 724_2025                                            |                                                                            |                                                                                                                                          |

## 1. Localización del diagnóstico

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Vereda / sector              | LA BOCANA          |
| Dirección del punto / sector |                    |
| Latitud                      | 5.734768880788678  |
| Longitud                     | -75.60156543568525 |
| Coordenadas formulario       | -75.6_5.73         |

## 2. Información de acompañamiento, energía y montaje

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Acompañamiento funcionario alcaldía | SI   |
| Nombre del funcionario              |      |
| Proveedor de energía                | EPM  |
| Otro proveedor de energía           |      |
| Tipo de montaje                     | OTRO |
| Otro montaje                        | Arco |

## 3. Medio de comunicación y cantidades

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Medio de comunicación | FO |
| Fibra óptica - ml     | 0  |
| Cable de datos - ml   |    |
| Drop fibra - ml       |    |
| Radio enlace - un     |    |

## 4. Poste, caja e infraestructura asociada

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tipo de poste / material             |                        |
| Altura del poste                     |                        |
| Existe caja subterránea              | NO                     |
| Requiere caja                        | SI                     |
| Tipo de caja                         | CAJA_50X50             |
| Estado caja                          |                        |
| Estado operativo caja                |                        |
| Cantidad cajas - un                  | 2                      |
| Requiere infraestructura subterránea | SI                     |
| Infraestructura subterránea          | CANALIZACION_INFRA_SUB |
| Cantidad canalización - ml           | 8                      |
| Cantidad tubería - ml                |                        |
| Cantidad bajante - ml                |                        |
| Cantidad andén - m2                  |                        |
| Cantidad cordones - un               |                        |

## 5. Gabinete, elementos de montaje y sistema eléctrico

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Requiere gabinete metálico | SI           |
| Tipo de gabinete           | GABINETE_EXT |
| Requiere corona            | SI           |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Requiere brazo fijo               | NO |
| Requiere brazo escualizable       | NO |
| Requiere soporte de pared         | NO |
| Requiere mástil radio enlace      | NO |
| Requiere transformador reductor   | SI |
| Requiere acometida eléctrica      | SI |
| Cantidad acometida eléctrica - ml | 20 |
| Requiere SPT                      | SI |

6. Red, radio enlace, UPS y switch

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Requiere radio enlace                 | NO      |
| Existe disponibilidad / cobertura BTS |         |
| Requiere infraestructura inalámbrica  |         |
| Requiere cámara                       | SI      |
| Cantidad de cámaras                   | 2       |
| Requiere UPS                          | SI      |
| Tipo UPS                              | UPS_1_5 |
| Requiere switch                       | SI      |
| Tipo switch                           | SW_8P   |
| Requiere arco pórtico                 | SI      |

7. Cámaras diagnosticadas

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Tipo de cámara | Tipo cámara fija |
| LPR            |                  |

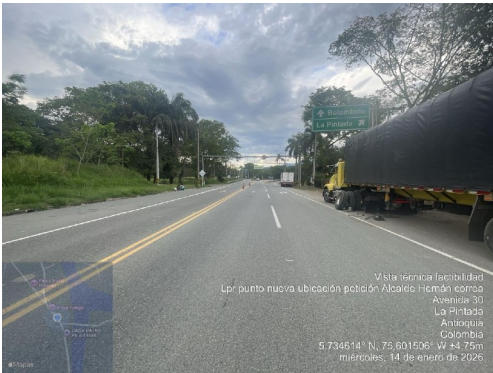
8. Licencias requeridas

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Requiere licencias                        | SI          |
| Licencias seleccionadas                   | LIC_ISS     |
| Licencia cámara fija - un                 |             |
| Licenciamiento firewall tipo 1 - un       |             |
| Licenciamiento firewall tipo 2 - un       |             |
| Licenciamiento switch LAN - un            |             |
| Licenciamiento access point interior - un |             |
| Sistema operativo - un                    |             |
| Licencia controladora videowall - un      |             |
| Tipo licencia ISS                         | ISS_PREMIUM |
| Cantidad licencia ISS - un                | 2           |

9. Observaciones generales

|                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| se plantea instalar estructura tipo arco para dos camaras LPR para capturar en ambos sentidos, en cuanto a la fibra el punto mas cercano o en el poste de apoyo existente y que esta sera dejada por el contratista que esta tirando esa fibra |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

10. Registro fotográfico

|                                                                                                         |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fotografía 1</p>  | <p>Fotografía 2</p>  |
| <p>Fotografía 3</p>                                                                                     | <p>Fotografía 4</p>                                                                                      |



11. Control de aprobación

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Estado de aprobación     |  |
| Fecha de aprobación      |  |
| Aprobado por             |  |
| Observaciones aprobación |  |
