


	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO CCTV Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
--	--	---

ID punto de cámara	62-PC1
Número consecutivo	1
Municipio	Santo Domingo
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	01/09/2026
Operador	UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2024
Técnico responsable	Manuel Cuevas
Contrato disponible	706_2025

1. Localización del diagnóstico


Vereda / sector	LA DELGADITA
Dirección del punto / sector	053048, San Roque, Antioquia
Latitud	6.517610744226951
Longitud	-75.06391476107456
Coordenadas formulario	-75.06_6.52
Ubicación captura	

Croquis ubicación

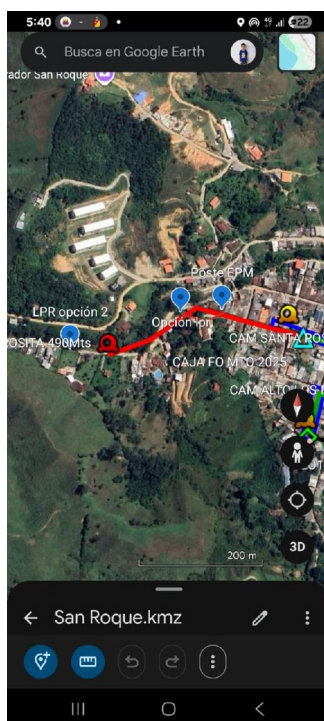

2. Información de acompañamiento, energía y comunicación

Acompañamiento funcionario alcaldía	NO
Nombre del funcionario	
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	
Información conexión eléctrica	
Medio de comunicación	FO
Información conexión comunicación	Se requiere una adicción de fibra para la segunda opcion de la LPR salida santa rosita
Fibra óptica - ml	150

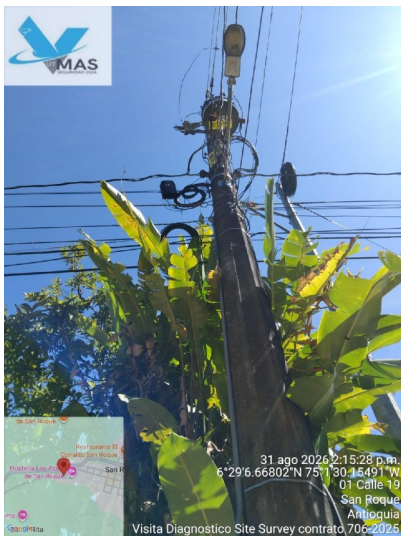Cable de datos - ml	
Drop fibra - ml	
Radio enlace - un	
Evidencia conexión eléctrica	Evidencia conexión comunicación
	

3. Componentes estructurales

Tipo de montaje	POSTE
Tipo de poste	POSTE_TIPO_L
Otro montaje	
Altura poste	
Requiere caja	SI
Tipo de caja	CAJA_TERMINAL_OB,CAJA_EMPALME
Cantidad cajas - un	1
Requiere infraestructura subterránea	SI
Infraestructura subterránea	CAJA_50X50
Cantidad canalización - ml	
Cantidad tubería - ml	
Cantidad bajante - ml	
Cantidad andén - m²	
Cantidad cordones - un	
Cantidad caja 50x50 - un	1
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo de gabinete	GABINETE_POSTE_FACHADA
Requiere corona	SI
Requiere brazo de soporte	NO
Tipo de brazo de soporte	

4. Componentes eléctricos

Requiere cables	SI
Tipos de cable	2X8+8AWG
Cable 2X8+8 AWG - ml	25
Cable 3X12 AWG - ml	
Cable 3X10 AWG - ml	
Cable UTP 6 exterior - ml	
Cable UTP 6 exterior mensajero - ml	
Requiere sistema puesta a tierra	SI
Requiere equipo TX/RX microondas	NO

5. Componentes de equipos

Requiere cámara	SI
Cantidad de cámaras	2
Requiere UPS	SI

Tipo UPS	UPS_1_5
Cantidad UPS - un	1
Requiere switch	SI
Tipo switch	SW_8P_IND
Cantidad switch - un	1

6. Cámaras diagnosticadas

Cámara	LPR
Ubicacion Camara 	Ubicacion Camara 
Ubicacion Camara 	Ubicacion Camara 

7. Licencias y servidores

Requiere licencias	SI
Licencias seleccionadas	LIC_VMS,LIC_VMS_PLACAS
Licencias integración VMS - un	2
Licencias reconocimiento placas - un	2
Licencias reconocimiento facial - un	
Licencias altavoz SIP - un	
Existe servidor	SI
Requiere servidor	
Tipo de servidor	SERVIDOR_ISS
Cantidad servidores - un	

Evidencia servidor

8. Observaciones generales

Observaciones


Se realiza visita tecnica para viabilidad para instalacion de una LPR en el municipio de san roque opcion 2

9. Registro fotográfico

Visual cámara 1



Visual cámara 2

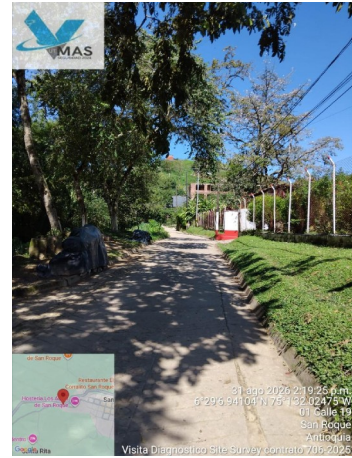

10. Control de aprobación

Estado de aprobación

Fecha de aprobación

Aprobado por

Observaciones aprobación
