

|  |                                                                          |                                                       |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO<br/>CCTV<br/>Proyecto Tasa de Seguridad</b> | <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| ID punto de cámara  | 65-PC24                            |
| Número consecutivo  | 24                                 |
| Municipio           | San Roque                          |
| Departamento        | Antioquia                          |
| Fecha diagnóstico   | 12/08/2026                         |
| Operador            | UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2024 |
| Técnico responsable | Manuel Cuevas                      |
| Contrato disponible | 706_2025                           |

### 1. Localización del diagnóstico

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Vereda / sector              | EL BRASIL                    |
| Dirección del punto / sector | 053037, San Roque, Antioquia |
| Latitud                      | 6.448974013136               |
| Longitud                     | -74.932115696569             |
| Coordenadas formulario       | -74.93_6.45                  |
| Ubicación captura            |                              |

Croquis ubicación



### 2. Información de acompañamiento, energía y comunicación

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acompañamiento funcionario alcaldía | SI                                                                                                              |
| Nombre del funcionario              | Maria Celeste                                                                                                   |
| Proveedor de energía                | EPM                                                                                                             |
| Otro proveedor de energía           |                                                                                                                 |
| Información conexión eléctrica      | En el punto de la camara no existe acometida electrica por lo tanto se propone una conexion a un predio privado |
| Medio de comunicación               | FO                                                                                                              |
| Información conexión comunicación   | La conexion de fibra optica inicia en la reserva de las camaras fijas del ingreso del municipio de              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | San Roque |
| Fibra óptica - ml                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12500     |
| Cable de datos - ml                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Drop fibra - ml                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Radio enlace - un                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <div> <div>Evidencia conexión eléctrica</div>  </div> <div> <div>Evidencia conexión comunicación</div>  </div> |           |

### 3. Componentes estructurales

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tipo de montaje                      | POSTE                  |
| Tipo de poste                        | POSTE_CONCRE           |
| Otro montaje                         |                        |
| Altura poste                         | 14MTS                  |
| Requiere caja                        | SI                     |
| Tipo de caja                         | CAJA_TERMINAL_OB       |
| Cantidad cajas - un                  | 1                      |
| Requiere infraestructura subterránea | NO                     |
| Infraestructura subterránea          |                        |
| Cantidad canalización - ml           |                        |
| Cantidad tubería - ml                |                        |
| Cantidad bajante - ml                |                        |
| Cantidad andén - m²                  |                        |
| Cantidad cordones - un               |                        |
| Cantidad caja 50x50 - un             |                        |
| Requiere gabinete metálico           | SI                     |
| Tipo de gabinete                     | GABINETE_POSTE_FACHADA |
| Requiere corona                      | SI                     |
| Requiere brazo de soporte            | SI                     |
| Tipo de brazo de soporte             | BRAZO_PTZ              |

### 4. Componentes eléctricos

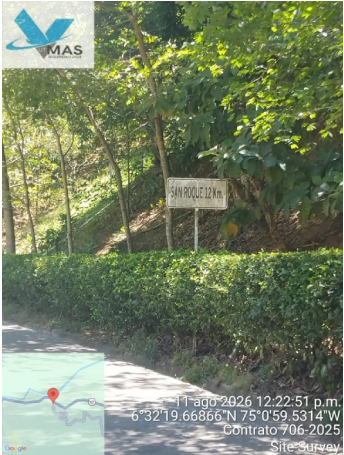
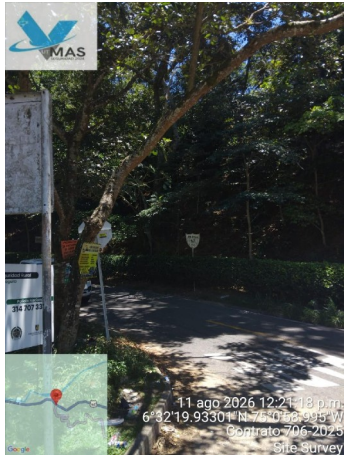
|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Requiere cables                     | SI       |
| Tipos de cable                      | 2X8+8AWG |
| Cable 2X8+8 AWG - ml                | 170      |
| Cable 3X12 AWG - ml                 |          |
| Cable 3X10 AWG - ml                 |          |
| Cable UTP 6 exterior - ml           |          |
| Cable UTP 6 exterior mensajero - ml |          |
| Requiere sistema puesta a tierra    | SI       |
| Requiere equipo TX/RX microondas    | NO       |

### 5. Componentes de equipos

|                 |    |
|-----------------|----|
| Requiere cámara | SI |
|-----------------|----|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Cantidad de cámaras  | 1         |
| Requiere UPS         | SI        |
| Tipo UPS             | UPS_1_5   |
| Cantidad UPS - un    | 1         |
| Requiere switch      | SI        |
| Tipo switch          | SW_8P_IND |
| Cantidad switch - un | 1         |

### 6. Cámaras diagnosticadas

| Cámara                                                                                                                                                                                                                      | PTZ                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ubicacion Camara</b></p>                                                                                                             | <p><b>Ubicacion Camara</b></p>                                                                                                            |
| <p><b>Ubicacion Camara</b></p>  <p>11 ago 2026 12:22:51 p.m.<br/>6°32'19.66866"N 75°0'59.5314"W<br/>Contrato 706-2025<br/>Site Survey</p> | <p><b>Ubicacion Camara</b></p>  <p>11 ago 2026 12:21:18 p.m.<br/>6°32'19.9330"N 75°0'59.5314"W<br/>Contrato 706-2025<br/>Site Survey</p> |

### 7. Licencias y servidores

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Requiere licencias                   | SI      |
| Licencias seleccionadas              | LIC_VMS |
| Licencias integración VMS - un       | 1       |
| Licencias reconocimiento placas - un |         |
| Licencias reconocimiento facial - un |         |
| Licencias altavoz SIP - un           |         |
| Existe servidor                      | NO      |
| Requiere servidor                    | NO      |
| Tipo de servidor                     |         |
| Cantidad servidores - un             |         |
| Evidencia servidor                   |         |

|  |
|--|
|  |
|--|

8. Observaciones generales

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Observaciones | No hay viabilidad para conexion electrica |
|---------------|-------------------------------------------|

9. Registro fotográfico

|  |
|--|
|  |
|--|

10. Control de aprobación

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Estado de aprobación     |  |
| Fecha de aprobación      |  |
| Aprobado por             |  |
| Observaciones aprobación |  |
