

ID punto de cámara	75-PC1
Número consecutivo	1
Municipio	Cisneros
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	03/09/2026
Operador	UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2024
Técnico responsable	Manuel Cuevas
Contrato disponible	706_2025

1. Localización del diagnóstico

Vereda / sector	EL DOS
Dirección del punto / sector	Vía 62, Cisneros, Antioquia
Latitud	6.539621829842634
Longitud	-75.0981130210811
Coordenadas formulario	-75.1_6.54
Ubicación captura	

Croquis ubicación



2. Información de acompañamiento, energía y comunicación

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Juan Sebastian Cardona
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	
Información conexión eléctrica	Conexion elecyrtrica a 220v para transformador y funcionamiento del pvv
Medio de comunicación	FO
Información conexión comunicación	
Fibra óptica - ml	0
Cable de datos - ml	
Drop fibra - ml	

Radio enlace - un	
Evidencia conexión eléctrica	Evidencia conexión comunicación
 1 sept 2026 2:49:47 p.m. 6°32'22.53725"N 75°5'52.13544"W 27-57 Barbosa-Puerto Berrio Cienarios Antioquia Visita Diagnostico Site Survey contrato 706-2025	 1 sept 2026 2:49:47 p.m. 6°32'22.53725"N 75°5'52.13544"W 27-57 Barbosa-Puerto Berrio Cienarios Antioquia Visita Diagnostico Site Survey contrato 706-2025

3. Componentes estructurales

Tipo de montaje	POSTE
Tipo de poste	POSTE_TIPO_L
Otro montaje	
Altura poste	
Requiere caja	SI
Tipo de caja	CAJA_TERMINAL_OB
Cantidad cajas - un	1
Requiere infraestructura subterránea	SI
Infraestructura subterránea	CAJA_50X50
Cantidad canalización - ml	
Cantidad tubería - ml	
Cantidad bajante - ml	
Cantidad andén - m²	
Cantidad cordones - un	
Cantidad caja 50x50 - un	1
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo de gabinete	GABINETE_POSTE_FACHADA
Requiere corona	SI
Requiere brazo de soporte	NO
Tipo de brazo de soporte	

4. Componentes eléctricos

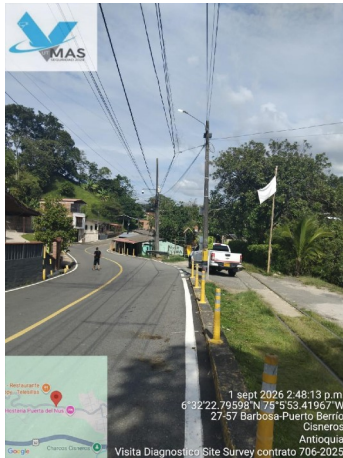
Requiere cables	SI
Tipos de cable	2X8+8AWG
Cable 2X8+8 AWG - ml	45
Cable 3X12 AWG - ml	
Cable 3X10 AWG - ml	
Cable UTP 6 exterior - ml	
Cable UTP 6 exterior mensajero - ml	
Requiere sistema puesta a tierra	SI
Requiere equipo TX/RX microondas	NO

5. Componentes de equipos

Requiere cámara	SI
Cantidad de cámaras	2
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_1_5
Cantidad UPS - un	1

Requiere switch	SI
Tipo switch	SW_8P_IND
Cantidad switch - un	1

6. Cámaras diagnosticadas

Cámara	LPR
Ubicacion Camara 	Ubicacion Camara 
Ubicacion Camara 	Ubicacion Camara 

7. Licencias y servidores

Requiere licencias	SI
Licencias seleccionadas	LIC_VMS,LIC_VMS_PLACAS
Licencias integración VMS - un	2
Licencias reconocimiento placas - un	2
Licencias reconocimiento facial - un	
Licencias altavoz SIP - un	
Existe servidor	SI
Requiere servidor	
Tipo de servidor	SERVIDOR_ISS
Cantidad servidores - un	
Evidencia servidor	

8. Observaciones generales

Observaciones	Se realiza visita tecnica para viabilidad de instalacion de una LPR tipo L en el municipio de Cisneros
---------------	--

9. Registro fotográfico

Visual cámara 1	Visual cámara 2
------------------------	------------------------

10. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	
